INVESTOR
Bc. Markéta Edwards,
K dálnici 167, Pitkovice,
104 00 Praha 10

VEDOUCÍ PROJEKTU
Ing. Josef Frydrýn

VYPRACOVAL
Ing. Václav Křepelák, DiS.

AUTORIZACE
Ing. Miloš Slavík

STAVBA
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
parc. č. 154/10 a 154/16
k.ú.: Jevany [659312]

OBEC
Jevany [533378]

STUPEŇ PD
DSP+DPS

DATUM
09/2025

VÝKRES
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.

LUCERN
moderní dřevostavby

LUCERN DŘEVOSTAVBY s.r.o.
ÚDOLNÍ 280/15
PRAHA 4 - BRANÍK
147 00

Digitálně podepsal Ing. Miloš Slavík
Datum: 2026.03.09 08:41:51 +01'00'

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Parcela leží v lokalitě, která je určena k zastavění, v katastru nemovitostí je vedena jako zahrada. Pozemek je svažitý od severu k jihu. Parcela se nachází v zastavitelném území. Pozemek je oplocen. Objekt svou výškou, objemem a proporcemi nenaruší prostor v dané lokalitě.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Dle platného územního plánu a navrženého funkčního využití ploch, je umístění navrženého rodinného domu i garáže přípustné.
Návrh rodinného domu i garáže jsou v souladu s územním plánem obce Jevany. Parkování je navrženo na pozemku stavebníka. Jsou navrženy dvě parkovací místa na zpevněných plochách, případně v garáži.

Jedná se o individuální rodinný dům o jednom nadzemním podlaží.

Zastavěnost

Zastavěná plocha rodinného domu: 180,38 m^2

Zpevněné plochy, terasa, garáž: 170,94 m^2

Plocha pozemku celkem: 1 091 m^2

Zastavěnost vč. zpevněných ploch: 351,32 m^2

Zbylá zelená plocha pozemku: 739,68 m^2

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Dle platného územního plánu města a navrženého funkčního využití ploch, je umístění navrženého rodinného domu přípustné.

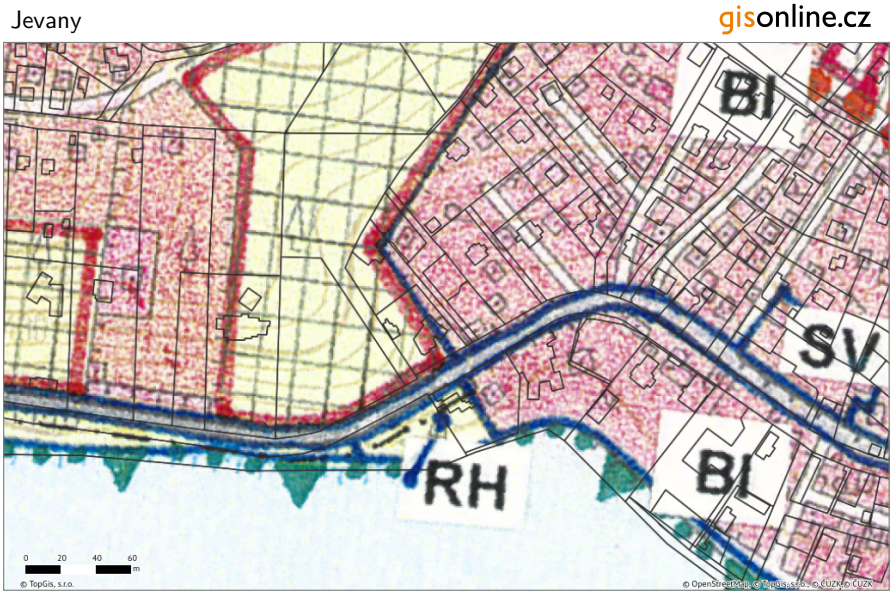

Pozemek stavebníka se nachází v obci Jevany, katastrální území Jevany. Níže je uveden výňatek z územního plánu pro obec Jevany, který obec vydala. Dotčený pozemek se nachází dle územního plánu nachází v části **BI: Bydlení individuální**.

I.02. Bydlení individuální - BI BI.pdf Strana 1/1

A. Dominantní činnost:

Obytná - plochy nízkopodlažní obytné zástavby - *individuální rodinné domy o max. 2 nadzemních podlažích s podkrovím. U nových objektů jsou podmínkou vestavěné garáže.*

B. Přijatelné činnosti:

Individuální rekreace, ubytovací, sociální, maloobchodní služby obyvatelstvu, domácí výroba - penziony se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku/, lokální maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení, nezávadná řemeslná výroba, drobné chovatelství a pěstitelství - pro potřeby obyvatel zóny /vliv činností, provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivnit pozemky souseda sloužící nebo určené k bydlení nebo rekreaci.

C. Nepřípustné činnosti:

Všechny druhy výrobních činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

V PD jsou splněny požadavky dané vyhláškou 360/2021 Sb. a vyhláškou 269/2009 Sb.
Umístění navržené stavby rodinného nevyžaduje žádné výjimky.
Rodinný dům je navržený na pozemku, který je schválený územním plánem, který vydala obec.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky všech dotčených orgánů jsou v PD splněny.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pozemek bude při vytýčení stavby tachymetricky zpracován a polohopisně určen geodetem. Byl proveden geologický průzkum pro vsakování srážkových vod a doporučení pro návrh vsakovacího zařízení. Na pozemku bylo dále provedeno radonové měření – radonový index vysoký. Staveniště je možno označit jako vhodné. Jedná se o jednoduché základové poměry, kde se základová půda nemění v rozsahu staveniště.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemek se nenachází v chráněném území.
Na pozemku se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. z živočišných druhů se zde rovněž nevyskytují žádné zvláště chráněné.
V oblasti staveniště se nenacházejí ani ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací prostory, prognózní zdroje nerostných surovin ani poddolovaná území.
Lokalita není součástí záplavového území.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavby nejsou podsklepené, jsou samostatně stojící o jednom nadzemním podlaží. Svojí výškou stavby zapadají do okolní zástavby. Stavby nemají vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry území jsou řešeny na pozemku investora pomocí dešťové jímky s přepadem do vsakovacího zařízení.

Není potřeba zpracovávat posouzení vlivu dokončené stavby na životní prostředí dle přílohy č. 3, zákona č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních hodinách pracovních dnů. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. S odpady vznikajícími ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků.

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace.

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na rozvody elektro (NN):
Stavba bude připojena na síť NN z pilířku v části uličního oplocení.
V pilířku je osazen elektroměrový jistič a hlavní nožové pojistky. Jištění 3 x 32 A.

Napojení na rozvody vody:
Stavba RD bude napojena na stávající vodovodní řad přes vodovodní šachtu.

Napojení na rozvody kanalizace:
Stavba RD bude napojena na stávající kanalizační řad přes kanalizační šachty.

Napojení na rozvody plynu:
Stavba RD nebude napojena na rozvody plynu.

Pošta:
Umístění poštovní schránky se uvažuje v linii vstupní branky.

Napojení na komunikaci:
Napojení RD je řešeno stávajícím sjezdem k veřejné komunikaci, která se nachází před pozemkem s řešeným objektem. Povrch přístupového chodníčku je navržen ze zámkové dlažby. Dvě parkovací místa jsou řešena na pozemku investora.

Vnější zpevněné plochy jsou navrženy jako bezbariérové a splňují požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb. Dále nejsou jiné požadavky na bezbariérovost.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavby nejsou vázány na realizaci jiné stavby, ani na jiné investice.

n) seznam pozemků na kterých se stavba provádí (podle katastru nemovitostí)

Pozemek stavby je ve vlastnictví investora:
par. č..: 154/10 a 154/16 – zahrada (1 091 m^2)

o) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Sousední pozemky:

SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI

st. 113	Zastavěná plocha a nádvoří, 508 m^2 Hraníková Daniela, Ve Skále 727, 250 92 Šestajovice
154/6	Zahrada, 338 m^2 Hraníková Daniela, Ve Skále 727, 250 92 Šestajovice
154/8	Zahrada, 338 m^2 Skořepová Lucie, Nechvílova 1838/15, Chodov, 148 00 Praha 4
157/19	Zahrada, 2 705 m^2 Dušková Dagmar Ing., Hájecká 184, 253 03 Chýně
562/6	Ostatní plocha, 29 443 m^2 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
st. 129	Zastavěná plocha a nádvoří, 274 m^2 Paul Oldřich MUDr., Högerova 1098/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
154/11	Zahrada, 1 042 m^2 Paul Oldřich MUDr., Högerova 1098/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
154/15	Zahrada, 21 m^2 Paul Oldřich MUDr., Högerova 1098/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
288/165	Ostatní plocha, 338 m^2 Tavandzis Georgios, Ježník 2433/104, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace je novostavba rodinného domu a garáže. Rodinný dům i garáž jsou navrženy s jednou bytovou jednotkou o dispozici 4+KK.
Jedná se o jednopodlažní dům zastřešený plochou střechou.

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu rodinného domu a garáže.

b) účel užívání stavby
Stavba RD je navržena k trvalému bydlení, stavba garáže pro parkování osobních automobilů.

c) trvalá nebo dočasná stavby
Stavby jsou trvalé.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Pro tuto stavbu nejsou žádné vydané výjimky, popř. úlevová řešení.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Požadavky všech dotčených orgánů jsou v PD splněny.

f) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.)
Stavby nejsou kulturní památkou ani není požadována ochrana stavby dle jiných právních předpisů, než stanoví stavební zákon a OTP.

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.)
Je navržena stavba rodinného domu s 1 bytovou jednotkou.

a)	zastavěná plocha RD, terasy a zpevněných ploch, garáže:	351,32 m^2
b)	užitná plocha RD:	142,07 m^2
c)	obestavěný prostor:	608,69 m^3
d)	počet uživatelů:	4 osoby
e)	výška hřebene od 0,000:	3,41 m

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
Základní bilance stavby je uvedena v jednotlivých přílohách ZTI, vytápění a elektroinstalace.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Časový harmonogram prací vypracuje generální dodavatel stavby nebo bude určen investorem.
Jedná se pouze o rodinný dům. Nejprve bude provedeno založení objektu, poté bude provedena hrubá stavba, a nakonec dokončovací práce.

j) orientační náklady stavby
Generální dodavatel stavby vypracuje výkaz výměr vč. položkového rozpočtu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Jedná se o zástavbu v obytném území. Urbanistické prvky nejsou měněny. Rodinný dům je osazen jako solitér, stejně tak garáž.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba rodinného domu je navržena podle zadání stavebníka. Rodinný dům je dispozičně řešen jako 4+KK. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Objekt má jednoduchý tvar písmene L, o celkových půdorysných rozměrech 17,22 x 14,82 m. Rodinný dům je zastřešen plochou střechou se sklonem 2 %. Výška atiky ploché střechy rodinného domu vůči výškové kótě ±0,000 je na kótě 3,41 m. Objekt rodinného domu je navržen jako dřevostavba, založený na betonových pasech a železobetonové desce. Rodinný dům je stavba určená k bydlení a jedná se o trvalou stavbu. Rodinný dům je navržen pro potřeby užívání stavebníka. Navržená stavba plně respektuje charakter místa stavby i okolní zástavbu.
Stavba garáže je navržena podle zadání stavebníka. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Objekt má jednoduchý tvar obdélníkový, o celkových půdorysných rozměrech 6,00 x 3,00 mGaráž je zastřešena také plochou střechou se sklonem 2 %. Výška atiky ploché střechy rodinného domu vůči výškové kótě ±0,000 je na kótě 2,75 m. Objekt garáže je navržen jako dřevostavba, založený na betonových pasech a železobetonové desce. Garáž je stavba určená k parkování osobních automobilů a jedná se o trvalou stavbu. Garáž je navržena pro potřeby užívání stavebníka. Navržená stavba plně respektuje charakter místa stavby i okolní zástavbu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o projekt rodinného domu a garáže. Provozní řešení a technologie výroby není součástí projektové dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba rodinného domu ani garáž nejsou určeny k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavby budou provedeny z certifikovaných materiálů výrobků.

Objekt rodinného domu vytváří pro uživatele stavby předpoklady pro dodržování bezpečného provozování stavby jejím užíváním, stejně tak stavba garáže.
Návrh stavby je z hlediska bezpečnosti navržen dle platných stavebně-technických, elektrotechnických, statických a požárně-bezpečnostních předpisů, zejména se jedná o:
* Stavební zákon č. 283/2021 Sb.
* Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
* Stavba bude prováděna podle všech platných bezpečnostních předpisů a podle schválené projektové dokumentace. Budou dodrženy požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Rodinný dům i garáž jsou navrženy jako dřevostavba, založená na základových pasech a s železobetonovou základovou deskou.

b) konstrukční a materiálové řešení

Rodinný dům i garáž jsou navrženy jako rámová dřevostavba, založená na základových pasech s železobetonovou základovou deskou. Svislé konstrukce jsou opláštěné deskami Rigistabil. Osová vzdálenost sloupků je 625 mm. Prostor dutiny je vyplněn minerální tepelnou izolací. Zastřešení je tvořeno dřevěnými trámy. Jako střešní krytina je zvolena PVC folie krytina. Obvodové stěny RD jsou tvořeny dřevěnou sendvičovou konstrukcí.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavby jsou navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.
Veškeré stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému.

d) oplocení

Pozemek stavebníka je oplocen. Oplocení viz C.3.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Napojení na rozvody elektro (NN):
Stavba bude připojena na síť NN z pilířku v uliční části oplocení.
V pilířku je osazen elektroměrový jistič a hlavní nožové pojistky. Jištění 3 x 32 A.

Napojení na rozvody vody:
Stavba RD bude napojena na stávající vodovodní řad přes vodovodní šachtu.

Napojení na rozvody kanalizace:
Stavba RD bude napojena na stávající kanalizační řad přes kanalizační šachty.

Dešťová kanalizace bude napojena na dešťovou jímku s přepadem do vsakovacího zařízení.

Odvětrání prostor RD bude nucené, za pomoci rekuperační jednotky. Odvětrání prostor garáže bude zabezpečeno pomocí příčného, přirozeného větrání.

b) výčet technických a technologických zařízení

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem projektové dokumentace.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatná část dokumentace D.1.3. Požární bezpečnost staveb.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Viz Průkaz energetické náročnosti budovy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Samostatně řešeno v přílohách, jmenovitě ZTI, vytápění a elektroinstalace. Objekt rodinného domu ani garáže ani jejich vybavení nebudou zdrojem prašnosti ani vibrací

V průběhu výstavby budou práce probíhat tak, aby nepřekračovaly maximální povolené hlukové limity a nadměrně nezatěžovaly okolí stavby.
V interiéru jsou navrženy omyvatelné podlahy. Všechny prostory budou osvětleny, vytápěny v souladu s hygienickými předpisy. Materiály použité na stavbu mají vyhovující tepelně izolační vlastnosti a hygienické atesty. Stavba bude zásobována vodou a řádně odkanalizována.

Hladina akustického výkonu výparníku tepelného čerpadla IVT AIR X 70 je 53 dB"A".
Tepelné čerpadlo nutno umístit na pevný podklad.
Tepelné čerpadlo bude instalováno tak, aby hluk z budoucího provozu ventilátorů nepřekročil stanovené mezní hodnoty, dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, a to jak v navržené stavbě, tak v okolní zástavbě.
Stavba bude dopravně napojena na komunikaci, číslo parcelní 2828/5. Vzhledem k dostačenému osazení obytných částí RD od této komunikace a také svažitosti pozemku je negativní účinek hluku z dopravy minimální.

Hygiena a ochrana zdraví
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

Odpady
Stálé stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný komunální odpad bude na pozemku stavebníka. Pro 4 osoby je navržena nádoba na komunální odpad objemu 120l. Odpady vzniklé užíváním stavby budou likvidovány svozem, který zajišťuje pro své obyvatele obec.

Větrání
Větrání veškerých prostor rodinného domu je řešeno nuceně, za pomoci rekuperační jednotky. Odtah digestoře bude skrz strop do půdního prostrou. Větrání garáže je zabezpečeno příčným, přirozeným větráním.

Vytápění
Tepelným zdrojem pro krytí ztrát prostupem tepla a větráním bude tepelné čerpadlo a také krb. Součástí krbu bude také nehořlavá podložka, kvůli zamezení vzniku požáru. Osazení krbu i nehořlavé podložky zajistí odborná firma. TČ je umístěné v technické místnosti. Ohřev TUV bude připravována zásobníkem.

Osvětlení
Osvětlení bude navrženo LED svítidly – stropními, nástěnnými, které budou vybrány investorem. Ovládání osvětlení bude navrhovanými ovladači u vstupu do místnosti. Ovladače pro osvětlení budou umístěny ve výšce 1,2 m nad podlahou.
Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 36 0450, 36 0451 a souvisejícími zdravotními a hygienickými předpisy.

Blance spotřeby vody
Průměrná roční spotřeba vody dle vyhl. 120/2011
Počet osob No = 4 osoby
spotřeba pitné vody 160
l/os/den
Spotřeba TV 40 l/os/den
Průměrná denní spotřeba pitné vody … Qd = 4 x 160 = 640 l/den
Maximální denní spotřeba pitné vody … Qdmax = 1,5 x 640 = 960 l/den
Maximální hodinová spotřeba pitné vody … Qhmax = 1,8 x 960/24 = 72 l/hod
Roční spotřeba vody … Qrok = 640 x 365 = 233,6 m^3/rok
Návrhová potřeba TV (40 l/osoba/den) … 160 l/den

Bilance splaškových vod
Průměrné denní množství Qd = 640 l/den
Maximální denní množství Qdmax = 1,5 x 670 = 960 l/den
Roční množství odváděných splaškových vod Qrok = 960 x 365 = 350,400 m^3/rok

Bilance dešťových vod

Byl proveden geologický průzkum pro vsakování srážkových vod z okapových svodů plánovaného rodinného domu.

VSTUPNÍ ÚDAJE PRO DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

- koefcient vsaku geologického prostředí kv (dle ČSN 75 9010) = 5,0 x 10^{-6} ms^{-1}
- regulovaný odtok ze vsakovacího zařízení povolený správcem vodního toku,
- provozovatelem kanalizace nebo úřadem státní správy = 0,0 l/s/ha

VÝSLEDKY DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

- aktivní vsakovací plocha vsakovacího zařízení = 16 m^2
- požadovaný retenční objem vsakovacího zařízení = 9,76 m^3
- doba prázdnění vsakovacího zařízení = 67,8 h
- doporučená hloubková úroveň aktivní vsakovací zóny = 2,8 m pod terénem

Proudová hodnota jističe - elektropřípojka:

Tepelné čerpadlo … 7 kW
Indukční deska …1 ks … 5,0 kW
Vestavěná elektrická trouba … 1 ks … 3,0 kW
Myčka … 1 ks … 1,8 kW
Mrazák … 1 ks … 0,3 kW
Pračka … 1ks … 2,1 kW
Lednice … 1 ks … 0,1 kW
Mikrovlnná trouba 1 … 2,0 kW
Rychlovarná konvice … 1 ks … 2,0 kW
Digestoř 1 ks … 0,2 kW
Osvětlení … kpl … 2,0 kW
PC, elektronika … kpl … 2,0 kW
Maximální soudobý příkon 15,95 kW
Proudový odběr připojené zátěže 24,20 A
Zvolená hodnota jističe 3 x 32 A

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Soubor měření OAR vykázal třetí kvartil 72,3 kBq/m^3.
Plochu jako celek lze charakterizovat plynopropustností střední.

Stavební pozemky v katastrálním území: Jevany

parc. č.: 154/10 a 154/16

mají podle výsledků měření,

ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky SÚJB o

radiační ochraně č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

radonový index pozemku vysoký

Požadavku ČSN 73 0601 [3] vyhoví v celém objektu jedna vrstva povlakové hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a odvětrání podloží. V případě nutnosti je možné použít druhou vrstvu této hydroizolace.

Ve štěrkovém loži pod základovou deskou bude proveden rozvod drenážních trubek DN60 pro odvětrání radonu z podloží. Vyústění bude provedeno skrz základ základovou desku.

b) ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se namáhání bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavby nejsou navrženy pro lokality s technickou seizmicitou, v případě výskytu blízkých zdrojů technické seizmicity, tedy železnice, silnic rychlostních a dálničních komunikací apod., je nutné posoudit stavebně konstrukční řešení objektu a případně jej změnit.

d) ochrana před hlukem

Stavba rodinného domu tvoří jednu bytovou jednotku a splňuje požadavky normy ČSN 73 0532 z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a stavební normované hladiny akustického tlaku.
Obvodové pláště rodinného domu jsou navrženy z certifikovaných systémů (okna, svislé konstrukce, střecha, apod.).
K zabezpečení řádné funkce podlah je nezbytné dodržet tyto zásady:
Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE folií, která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím jejímu akustickému znehodnocení.
Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky i okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z minerální vlny tl. 15 mm. Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně uzavřou vrstvou trvale plastického tmelu.
Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem k stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. Potrubí rozvodů vody a odpadů je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí desky a nosné konstrukce. Při zdění je nutné dodržet technologický předpis.

V dílci ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků) se nejedná o území zatížené zdrojem hluku.

Stavby jsou navrženy v souladu s platným územním plánem (územní studií) obce umožňující bydlení v rodinných domech. Stavba bude dopravně napojena na komunikaci, číslo parcelní 320/2. Vzhledem k dostačenému osazení obytných částí RD od této komunikaci je negativní účinek hluku z dopravy minimální.

V blízkosti objektu není lokalizován žádný výrazný zdroj hluku. Z tohoto důvodu není nutné přijímat opatření k ochraně před nadměrným hlukem.
Dodavatel výplní otvorů dodá prohlášení o shodě a o splnění požadované zvukové neprůzvučnosti.
Navrhované materiály pro tuto stavbu budou zajišťovat dostatečnou zvukovou izolaci.

Hladina akustického výkonu výparníku tepelného čerpadla IVT AIR X 70 je 53 dB"A".
Tepelné čerpadlo nutno umístit na pevný podklad.
Tepelné čerpadlo bude instalováno tak, aby hluk z budoucího provozu ventilátorů nepřekročil stanovené mezní hodnoty, dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, a to jak v navržené stavbě, tak v okolní zástavbě.

Akce počítá s návrhem venkovní jednotky tepelného čerpadla (zdroje hluku). Pro výpočet je vztažena kóta ve směru šíření hluku, a to ve vzdálenosti 5,06 m – viz. C.03.1.

Navržené zařízení – tepelné čerpadlo IVT AIR X 70 generuje hluk o akustickém výkonu (stanoveném dle EN 12102) 53 dB"A – viz. níže technický list venkovní jednotky tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo – venkovní jednotka		AIR X 50	AIR X 70	AIR X 90	AIR X 130	AIR X 170
Topný výkon při 7°C /35°C[1] 100%	kW	5,0	7,0	9,0	13,0	17,0
Topný výkon při 7°C / 35°C[1] 40%	kW	2,03	2,96	3,13	4,93	4,90
Topný faktor při 7°C / 35°C[1] 40%		4,57	4,84	5,09	4,62	4,99
Topný výkon při 2°C / 35°C[1] 100%	kW	4,0	6,0	8,0	11,0	14,0
Topný výkon při 2°C / 35°C[1] 60%	kW	2,79	3,9	5,06	6,49	7,40
Topný faktor při 2°C / 35°C[1] 60%		3,89	4,13	4,07	4,03	4,03
Topný výkon při -7°C/35°C[1] 100%	kW	4,57	6,18	7,61	10,79	12,45
Topný faktor při -7°C / 35°C[1] 100%		2,75	2,82	2,64	2,70	2,55
SCOP [2]		4,69	4,72	4,65	4,84	4,81
Chladící výkon při 35/18°C		5,9	6,7	9,3	11,1	11,9
EER		4,23	3,65	3,64	3,23	3,28
Elektrické napájení		230 V, 1N, AC, 50 Hz			400 V, 3N, AC, 50 Hz	
Jistič pro tepelné čerpadlo	A	10	16	16	13	13
Max. el. příkon	kW	2,3	3,2	3,6	7,2	7,2
Množství chladiva R 410A[3]	kg	1,7	1,75	2,55	3,3	4,0
Nominální průtok topným systémem	l/s	0,24	0,33	0,43	0,62	0,81
Interní tlaková ztráta TČ	kPa	9,7	7,8	10,5	15,8	22,9
Ventilátor (DC Inverter), max. příkon	W	180			280	
Maximální průtok vzduchu	m3/h	4 500			7 300	
Hladina akustického tlaku v 1 m	dB(A)	40			43	
Hladina akustického výkonu[6]	dB(A)	53			57	
Elektrické krytí		IP X4				
Maximální teplota topné vody	°C	60°C (do -5°C), 52°C (do -15°C)				
Rozměry (šířka × výška × hloubka)	mm	930 × 1370 × 440			1200 × 1680 × 580	
Hmotnost	kg	67	71	75	130	132
Připojení topného okruhu		G1" vnější závit				
Připojení odvodu kondenzátu		Plast 32 mm				
Odtávání		Horkým plynem přes čtyřcestný ventil				
Kompresor		Dvojitý rotační frekvenčně řízený, Mitsubishi Electric				
Minimální provozní teplota	°C	-20°C				
Funkce chlazení		ANO				
Štítek hermeticky těsný okruh		ANO				

Ve vzdálenosti 5,06 m za předpokladu šíření v jednom kvadrantu plochy (Q=4) bude hladina akustického tlaku rovna:

$$L_P = L_W + 10\log\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

L_p max= 53 + 10log (4/4π8,5^2)= 33,95 dB

Tepelné čerpadlo je pro rodinný dům navrženou jedno. Čerpadlo je umístěno u západní fasády objektu. Nařízení vlády č.272/2011 Sb., stanovuje hodnocení dle ekvivalentní hladiny akustického taku LAeq,T. Ve výpočtu je uvažován nepřetržitý provoz celých 60 minut z jedné hodiny. Hluk pozadí, který by měl doplňovat výpočet v době, kdy čerpadlo neběží, je i v nočních hodinách pro danou lokalitu nezjistitelný. Toto pozadí může být vzhledem k okolní situaci vysoké a může převyšovat hluk emitovaný z tepelného čerpadla. Vzhledem k neznalosti této hodnoty a k nutnosti posoudit zátěž čerpadlem je tedy nutné zvolit pro výpočet ekvivalentní hladiny hluk pozadí tabulkově a předpokládat momentální klid. Tiché noční ulici odpovídá hladina akustického tlaku 30 dB.

$$L_{pAeq,T} = 10log\left[\frac{1}{\Sigma t_i}\Sigma(t_i \cdot 10^{(0,1L_{Ai})})\right]$$

Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro jednu noční hodinu pak bude rovna:
$L_{Aeq,T\ noc}$= 10log [(1/60)*(0*$10^{(0,1*30)}$+53*$10^{(0,1*33,95)}$)] = 33,4 dB

Stanovený limit pro denní hodinu je 50 dB. Stanovený limit pro noční hodinu je 40 dB. Stanovený limit pro denní hodinu s korekcí na riziko výskytu tónových složek je 45 dB. Stanovený limit pro noční hodinu s korekcí na riziko výskytu tónových složek je 35 dB.
33,4 dB < 35 dB limit pro noční hodinu => VYHOVUJE

Akce počítá s návrhem vnitřní vzduchotechnické jednotky (zdroje hluku).

Pro výpočet je vztažena kóta ve směru šíření hluku, a to ve vzdálenosti 23,52 m – viz. C.03.1.

Navržené zařízení – rekuperační vzduchotechnická jednotka ComfoAir Q350 TR vč. Entalpie generuje při nejvyšším výkonu na vyústění z jednotky hluk akustickém výkonu 59 dB viz. technický list jednotky:

Výkonostní údaje

Výkon [%]	QV [m³/h]	Pst [Pa]	I [A]	Pe [W]	cos phi [-]	Přívod dB(A)	Odtah dB(A)	Jednotka dB(A)
30	125	13	0.15	16	0.43	49	35	34
34	125	32	0.18	19	0.44	52	39	37
40	125	61	0.21	24	0.46	54	41	40
46	210	29	0.33	39	0.51	59	45	44
49	210	50	0.38	42	0.5	60	46	45
53	200	92	0.41	49	0.52	61	48	47
56	185	131	0.45	55	0.52	64	54	49
57	263	50	0.52	60	0.53	63	53	48
64	290	60	0.65	81	0.54	66	52	51
69	260	151	0.76	95	0.54	68	52	53
74	240	229	0.85	108	0.54	69	56	55
83	375	100	1.22	142	0.55	70	58	58
91	340	258	1.53	196	0.55	73	58	59
95	300	351	1.53	197	0.55	74	59	61

Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti 23,52 m:

L1 (1 m) = hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m (tabulková hodnota)

L2 (23,52) = hledaná hladina akustického tlaku

r1 = vzdálenost 1 m

r2 = vzdálenost 23,52 m

L2 (23,52) = L1 (1 m) + 20 log (r1/r2) = 59 + 20 log (1/23,52) = **31,6 dB**

e) protipovodňová opatření

Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým, navrženými obvodovými konstrukcemi a střechou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt RD bude připojen na inženýrské sítě. viz koordinační situace C.3.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých částech dokumentace – elektroinstalace, zdravotně technické instalace, vytápění.

Připojení na splaškovou kanalizaci:
Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační řad přes kanalizační šachty.
Dimenze potrubí je patrná ve výkresové části dokumentace. Bude použita PVC DN 125, při souběhu více vedení doporučuje projektant tuto dimenzi zvětšit na DN 160, což v tomto případě bude nutné.

Připojení na vodovodní síť:
Rodinný dům bude napojen na stávající vodovodní řad přes vodovodní šachtu. Potrubí PE DN 32 bude vedeno do objektu. V místnosti 1.01 bude vyvedeno do podlahy, kde bude přepojeno na potrubí PPR DN 32. Hlavní uzávěr vody bude umístěn v technické místnosti 1.03. Domovní uzávěr vody bude situován v technické místnosti, v místnosti č. 1.03.

Připojení na síť NN:
Stavba bude připojena na síť NN z pilířku v části uličního oplocení, který je na hranici pozemku V pilířku je osazen elektroměrový jistič a hlavní nožové pojistky. Jištění 3 x 32 A.

Likvidace dešťových vod:
Dešťové svody budou přes lapače střešních splavenin napojeny do svodného potrubí dešťové kanalizace, která bude gravitačně svedena do dešťové jímky s přepadem do vsakovacího zařízení na pozemku investora, který bude osazen v jihovýchodní části pozemku 154/16.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavby jsou dopravně napojeny na stávající přilehlou komunikaci. Rodinný dům je navržen pro jednu rodinu. Má parkovací stání pro dva osobní automobily na zpevněných plochách na pozemku stavebníka a také v garáži.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Lokalita je obslužná z jihu po místní zpevněné komunikaci.

c) doprava v klidu

Na pozemku stavebníka je navrženo stání pro dva osobní automobily na zpevněných plochách a případně v garáži.

d) pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanými stavbami dotčeny.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Není předmětem dokumentace.

b) použité vegetační prvky

Pozemek bude po dokončení stavby upraven a zatravněn, případně s lokálním osazením dřevin.

c) biotechnická opatření

Není předmětem dokumentace.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavby neprodukují zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Rodinný dům nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk a půdu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Upravované území se nachází uvnitř zastavěného území obce, vliv na přírodu a krajinu je minimální. Případné stávající dřeviny v upravovaném území budou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Upravovaná plocha se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby není podkladem.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma, podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavby vzhledem ke svému charakteru nevyžadují opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

b) odvodnění staveniště

Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné komunikace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro odběr elektřiny během stavby bude využit elektroměrový rozvaděč. Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. S odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavby budou probíhat na pozemku investora, nebude omezen provoz a pohyb před pozemkem investora. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. a následujících 591/2006 Sb. a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií.

Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího).

Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpady vznikajícími při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění a platných vyhlášek.

Odpady vznikající ve fázi výstavby

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kat.	Způsob nakládání s odpadem[2/]	Druh odpadu	Množství/ odhad množství v tunách
17 02 01	Dřevo	O	recyklace	Dřevo	*0,100*
17 02 03	Plasty	O	odstranění	Plasty	*0,020*
17 04 05	Železo a ocel	O	recyklace	Železo a ocel	*0,100*
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	využití v rámci stavby, předání k recyklaci	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	*3,000*
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly17 06 01 a 17 06 03	O	odstranění	Izolační materiály neuvedené pod čísly17 06 01 a 17 06 03	*0,700*
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	recyklace	Papírové a lepenkové obaly	*0,020*
15 01 02	Plastové obaly	O	recyklace	Plastové obaly	*0,005*
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03	O	odstranění	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03	*2,000*
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	odstranění	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	*0,001*

Odpady jsou během stavby odděleně soustřeďovány a následně předávány k využití či odstranění do zařízení pro nakládání s odpady. Nakládání s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. V případě nebezpečného odpadu 15 01 10* je odděleně soustřeďován do barevně odlišené nádoby vybavené identifikačním listem a popisem. Předpokládané maximální produkované množství tohoto odpadu je cca 1 kg.

Předpokládané množství vzniklých odpadů kategorie O je cca 6 t.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie zeminy. Sejmutá ornice a vytěžená zemina bude skladována na pozemku investora a následně použita k modelaci terénu a k zpětným zásypům. Vytěžená zemina nevhodná pro zpětné účely bude odvezena na vhodnou skládku. Zemina vytěžená při realizaci rýh pro inženýrské sítě bude mezideponována podél rýhy a následně bude sloužit pro zpětný zásyp rýhy. Místa skládek, kam budou přebytečné zeminy odváženy, si určí dodavatel stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma, nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC.
S odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími.
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace, nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen, popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavby budou probíhat bez stanovení speciálních podmínek pro provádění.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 12 měsíců od započetí stavby. Stavby nejsou členěny na etapy, budou provedeny jako jednorázová akce.
Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby:
zemní práce
základové konstrukce
zednické práce
hrubá stavba – příčky a podlahy
vnitřní kompletace – podhledy
kompletace vnitřních rozvodů
dokončovací stavební práce
okolní zpevněné plochy

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Splaškové vody budou odvedeny přes venkovní splaškové potrubí do kanalizačních šachet až do stávajícího kanalizačního řadu. Vodou bude objekt zásobován ze stávajícího vodovodního řadu přes vodovodní šachtu. Dešťové vody ze stavby rodinného domu budou likvidovány na pozemku stavebníka.

V Hořicích 9/2025

Ing. Václav Křepelák, DiS.

Ing. Miloš Slavík
